


来年3月の供用開始に向けて JR菊川駅工事の進捗状況をお知らせ

JR菊川駅は令和8年3月の供用開始へ向け、右写真のように予定通り工事が進んでいます。鉄骨工事が終わり、屋根工事が進むことで駅の全貌が見えてきました。ここでは普段は見ることのできない工事の裏側の一部を紹介します。引き続き未来の菊川駅のためご理解・ご協力をお願いします。


問い合わせ 都市計画課都市整備係 (☎35-0931)

▼完成予想イメージ図(北口)

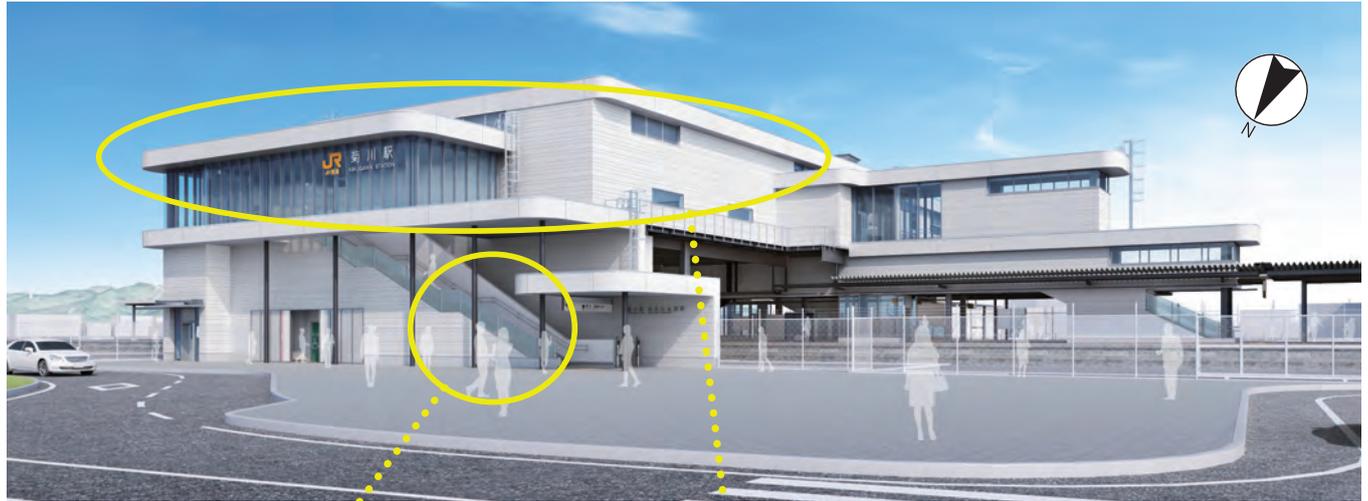

▼現在の状況

北口側の階段

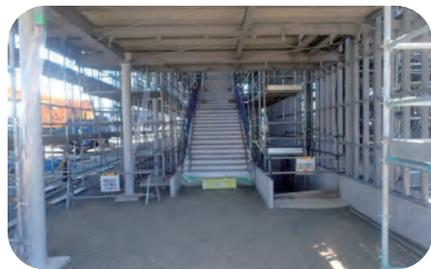

北口側の階段部分です。右側には上りエスカレーターがつくられていきます。

自由通路・駅舎内



自由通路・駅舎内の様子です。多くの鉄骨によってつくられている状況が見て取れます。

屋根



屋根工事の様子です。屋根工事が終わると外装と並行し自由通路の内装・設備の工事も進んでいきます。

▼今後のスケジュール

下記は現時点での計画です。状況により変更になることもあります。詳細は市ホームページ(右記)をご覧ください。



時期	内容
～R8.3月	南北自由通路工事を実施(外装・内装など)
R8.3月下旬	南北自由通路工事の完成(供用開始)
R8.4月頃～R9.9月頃	南口広場の復旧工事を実施
R8.9月頃～R10.3月頃	北口広場の整備工事を実施
R8.4月頃～R9.11月頃	既存駅舎・仮駅舎など解体工事を実施

寄附のご支援 ありがとうございます

令和5年度から多くの皆さまに寄附をいただいています。(計8,663万6,575円※9月5日時点)。誠にありがとうございます。芳名板の受付は終了しましたが、寄附は令和7年度末まで受け付けています。引き続き応援よろしくお願いします。寄附の詳細は市ホームページ(右記)をご覧ください。

